

COMUNE DI STRIANO (PROVINCIA DI NAPOLI)

INTESTAZIONE PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DELLA CASA COMUNALE DI STRIANO

LOCALITA' D'INTERVENTO
VIA MUNICIPIO
STRIANO (NA)

REV.: 00
DEL: APRILE 2022

Il Progettista:



Dott. Ing. Antonio Perillo
Via Martiri di Nassirya n.175
80047 - San Giuseppe Vesuviano (NA)
telefax 0815297391

Progetto
Project

ESECUTIVO RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA
PRINCIPALE E QUADRI ELETTRICI

Tavola
Drawing

CP

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Data/Date

APRILE 2022


Scala/Scale

//



(Dott. Ing. Antonio Perillo)

| ID | Modalità attività | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | Predecessori | Nomi risorse | |
|----|-------------------|---|--------|--------|------|--------------|--------------|--|
| 1 | ★ | REALIZZAZIONE COLONNE MONTANTI | 14 g | | | | | MMGVSD LMMGVSD LMMGVSD LMMGVSD LMMGVSD LMMGVSD LMMGVSD LMMGVSD |
| 2 | ★ | QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA | 5 g | | | 1 | | |
| 3 | ★ | QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO | 3 g | | | 2 | | |
| 4 | ★ | QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO | 3 g | | | 3 | | |
| 5 | ★ | QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO | 3 g | | | 4 | | |
| 6 | ★ | QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO | 3 g | | | 5 | | |
| 7 | ★ | FINITURE E COLLEGAMENTI | 3 g | | | 6 | | |
| 8 | ★ | CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE | 2 g | | | 7 | | |

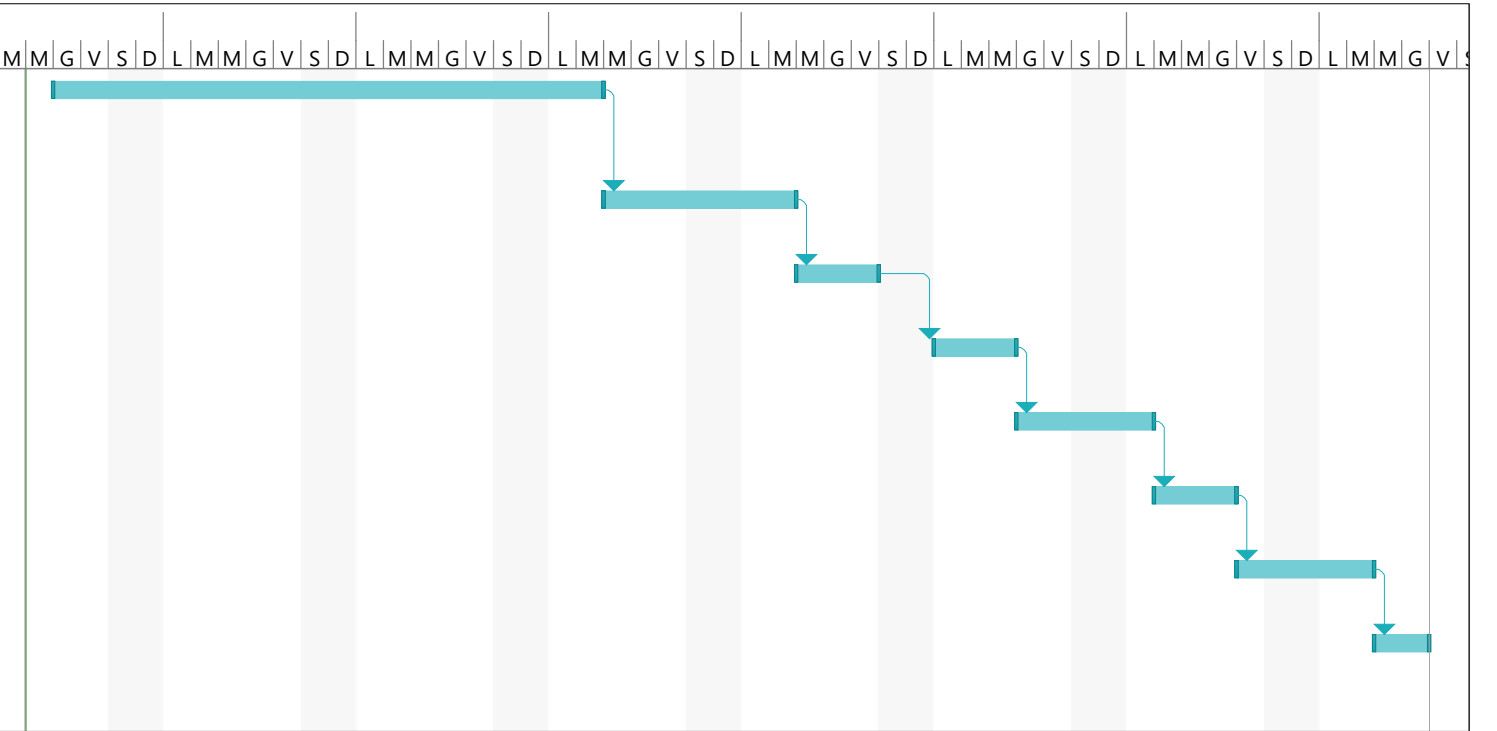

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|---|---------------------------|--|------------------|---|---------------------|--|
| Progetto: CRONOPROGRAMM Data: mer 20/04/22 | Attività | | Riepilogo progetto | | Attività manuale | | Solo inizio | | Scadenza | |
| | Divisione | | Attività inattiva | | Solo-durata | | Solo-fine | | Avanzamento | |
| | Cardine | | Cardine inattiva | ◆ | Riporto riepilogo manuale | | Attività esterne | | Avanzamento manuale | |
| | Riepilogo | | Riepilogo inattiva | | Riepilogo manuale | | Cardine esterno | ◆ | | |
